



# KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ


<b>Proje Adı: Kongre Merkezi ve Kütüphane İnşaatı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	39.980.000 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	10.02.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	24.06.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	22%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	22%
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan Kongre Merkezi ve Kütüphane İnşaatı % 26 oranında tamamlanmıştır.	

<b>Proje Adı: Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu</b>	<b>Proje Tutarı</b>	8.752.347,59 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	6.02.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	28.09.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	15%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	15%
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı % 14 oranında tamamlanmıştır.	

<b>Proje Adı: Tıp Fakültesi Derslik Binası</b>	<b>Proje Tutarı</b>	32.538.000 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	-
	<b>Bitiş Tarihi</b>	-
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Açıklama:</b> 22.06.2017 tarihinde ihalesi yapılan Tıp Fakültesi Derslik Binası İnşaatının ihale sonuçlandırma işlemleri devam etmektedir.	

<b>Proje Adı: Teknokent Binası ve Kuluçka Merkezi</b>	<b>Proje Tutarı</b>	8.895.000 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	7.04.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.01.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	10%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	10%
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan Teknokent Binası ve Kuluçka Merkezi % 12 oranında tamamlanmıştır. Teknokent Binası ve Kuluçka Merkezi projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklidir.	

<b>Proje Adı: Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.955.000 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	21.07.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	20.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	5%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi % 5 oranında tamamlanmıştır. Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi üniversitemiz ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının birlikte yürüttükleri projedir.	

<b>Proje Adı: Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	HİBE+ÜNİVERSİTE
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	75%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	-
	<b>Açıklama:</b> Bodrum + 4 kattan ibaret olup, kaba inşaat, çatı, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı alt yapı borulamaları ve elektrik tesisatının bir kısmı dernek(Türkoğlu Avası Geleneysel Okçuluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) tarafından yapılmıştır. Diğer imalatlar	

**Proje Adı: İlahiyat Fakültesi Türkoğlu Arapça Eğitim Bölümü Bina İnşaatı**



<b>Proje Tutarı</b>	HİBE
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2015
<b>Bitiş Tarihi</b>	-
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	40%
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	-
<b>Açıklama:</b> Türkoğlu Sosyal Kültürel Hizmetler ve İmam Hatip Eğitimini Yaşatma Derneği tarafından hibe olarak yapılmaktadır. A-B-C bloklarından oluşan A-B Blok 5 Kat, C Blok 4 Kat olmak üzere toplam 7.100 m2 alana sahip olup, A Blok kaba inşaatı tamamlanmış, B Blok 5. kat döşeme	

**Proje Adı: Merkez Camii İnşaatı**



<b>Proje Tutarı</b>	HİBE
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
<b>Bitiş Tarihi</b>	-
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	56%
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	-
<b>Açıklama:</b> Camii inşaatının %56'sı Diyanet İşleri Başkanlığının ve hayırseverlerin yardımı ile tamamlanmış olup, yapılacak yardımlarla devam ettirilecektir.	

**Proje Adı: Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çarşısı / Avşar Kampüsü Çarşısı**



<b>Proje Tutarı</b>	YAP İŞLET DEVRET MODELİ
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2015
<b>Bitiş Tarihi</b>	-
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	85%
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	-
<b>Açıklama:</b> Yap işlet devret modeli ile yapılmaktadır. Çarşı inşaatlarının imalatları devam etmektedir.	

## MTA ORTA ANADOLU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı: Türkiye Yer kabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması (Türkiye Geneli)	Proje Tutarı	1.196.000
	Başlangıç Tarihi	15.03.2017
	Bitiş Tarihi	31.05.2017
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	41%
	RESİM	Açıklama: Kahramanmaraş ilinde Jeolojik ve jeofizik çalışmalar 22.05.2017 tarihinde tamamlanmıştır. (Çalışmalar başka illerde devam etmektedir.)

Proje Adı:EÜAŞ K.Maraş Afşin-Elbistan Kömür Havzası B-Sektörü (Çöllolar Sahası) Nihai Şev Tasarım İşi (Jeoteknik Etüt)	Proje Tutarı	4.645.442,70
	Başlangıç Tarihi	25.04.2016
	Bitiş Tarihi	31.05.2017
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	18%
	RESİM	Açıklama:(EÜAŞ Adına Ücretli İş) 2016 yılından sarkan proje olup, 2017 yılında 5.002 m jeoteknik sondaj yapılarak, çalışmalar 04.05 2017 tarihinde tamamlanmıştır

Proje Adı:Ruhsat Etütleri (Türkiye Geneli)	Proje Tutarı	7.685.000
	Başlangıç Tarihi	22.05.2017
	Bitiş Tarihi	8.10.2017
	Fiziki Gerçekleşme	17%
	Parasal Gerçekleşme	3%
	RESİM	Açıklama:Prospeksiyon , jeolojik etüt ve sondaj çalışmaları devam etmektedir.

ÖNEMLİ: Proje tutarlarımız ülke bazını (farklı illeri) kapsadığı için fiziksel ve parasal gerçekleşme %'si arasında fark

## KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

**Proje Adı: KAHRAMANMARAŞ ÇEVREYOLU 3. ŞERİT İLAVESİ VE FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK YAPIM İŞLERİ**



<b>Proje Tutarı</b>	103.450.000
<b>Başlangıç Tarihi</b>	23.09.2013
<b>Bitiş Tarihi</b>	1.12.2017
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	93%

**Açıklama:** Toplam 16,5 Km uzunluğunda BY standardındır. Kahramanmaraş Çevre Yolu, (13,7 Km BY-BSK ve 2,8 Km 2\*3 BSK) olarak hizmet etmekte olup mevcut ihale, Çevre yolu bünyesinde 4 adet farklı seviyeli kavşak [(Madalyalı (152 m) Üniversite (150 m), Ağabeyli (78 m), Ağcalı (150 m)] yapımı ve 16,5 km'lik yolun 2x3 şeride çıkarılmasını kapsamaktadır.

2016 yılı sonu itibariyle 1,6 km BSK onarımı, Üniversite ve Madalyalı Kavşakları tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

**Proje Adı:K.MARAŞ-GÖKSUN- 6.BÖLGE HUDUDU(KAYSERİ) YOLU**




<b>Proje Tutarı</b>	2.528.000.000
<b>Başlangıç Tarihi</b>	1.03.2003
<b>Bitiş Tarihi</b>	Şub.19
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	65%

**Açıklama:** Toplam 124 km uzunluğunda ve BY standardındadır. Proje bünyesinde 12 adet Tünel (16.978 m) ve 4 adet Viyadük (1.263 m), 3 adet (135 m) farklı seviyeli kavşak, 3 adet (98 m) köprü bulunmaktadır. Şu ana kadar toplamda 87 km si BY (41,15 km BSK, 45,85 km SK) olarak bitirilmiş; 4 adet tünel (5761 m), 2 adet viyadük (570 m) tamamlanmıştır. 1.205 m uzunluğundaki Tekir tüneline ve 2.545 m uzunluğundaki Çağlayan tüneline kaplama betonu imalatı tamamlanmış olup. elektromekanik işlerinde çalışmalar devam etmektedir. T2 (1400 m), T3 (3678 m), T4 (500 m) ve T5 (610 m) tünellerinde kazı destek çalışmaları devam etmektedir. Aks üzerinde 3 kesimde çalışmalar ihaleli olarak devam etmektedir. Önceki ihale kapsamında tamamlanamayan 1 adet tünel (806 m) ve 2 adet viyadüğün (693 m) yer aldığı Km:74+000-83+660 kesiminde ise detay uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmaları tamamlandığında ihalesi yapılacaktır. Çalışmalar sonucu güzergahta 17,2 km kısalma sağlanacaktır.



<b>Proje Adı:(NARLI PAZARCIK) AYR.- ÇAĞLAYANCERİT İL YOLU (Km0+000-30+200)</b>	<b>Proje Tutarı</b>	58.700.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2.09.2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	Mar.18
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	28%
	<b>Açıklama:</b> Toplam 30,2 km uzunluğunda ve TY-SK standartındadır. 2016 yılı sonu itibariyle 3 km TY-SK yapılmıştır. 2017 yılında 3 km TY-SK yapılması ve 2 adet köprü (252 m) tamamlanması hedeflenmektedir.	

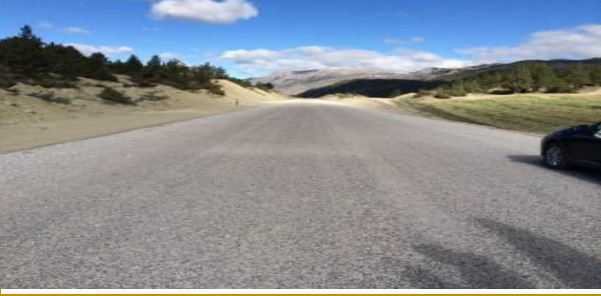
<b>Proje Adı:KADIRLI-ANDIRIN-GÖKSUN YOLU</b>	<b>Proje Tutarı</b>	100.000.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2.09.2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	May.18
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	33%
	<b>Açıklama:</b> Toplam 118 km uzunluğundaki yolda, 2016 yılı sonuna kadar 62,7 km (9 km BY, 53,7 km TY) Km'si tamamlanmıştır. Kahramanmaraş il sınırındaki uzunluğu 97 km olup toplam 41,7 km (8 km BY, 33,7 km TY ) tamamlanmıştır. Yol üzerinde 3 kesimde çalışmalar ihaleli olarak devam etmektedir.	

<b>Proje Adı:KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU-NURDAĞI YOLU</b>	<b>Proje Tutarı</b>	91.120.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	10.04.2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	May.18
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	28%
	<b>Açıklama:</b> Toplam 42 km uzunluğunda ve BY standartındaki yolun 34 km si Kahramanmaraş sınırları içinde olup SK olarak trafiğe açıktır. Bu ihale kapsamında SK>BSK yapılacaktır. 2016 yılı sonu itibariyle Kahramanmaraş ili sınırlarında 11,4 km SK>BSK (binder seviyesinde) tamamlanmıştır. 2017 yılında K.Maraş ilinde 2 km SK>BSK tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.	

<b>Proje Adı:GÖKSUN-ELBİSTAN YOLU (Km:5+500- 60+000)</b>	<b>Proje Tutarı</b>	135.200.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	29.12.2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	Oca.20
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	5%
	<b>Açıklama:</b> Toplam 68 km uzunluğunda ve BY-BSK standartındadır.2016 yılı sonu itibariyle muhtelif kesimlerdeki toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.	

Proje Adı:K.MARAŞ-NARLI-GAZIANTEP YOLU (KM: 14+748-40+196 ve KM: 0+000-34+989)	Proje Tutarı	352.800.000
	Başlangıç Tarihi	29.03.1995
	Bitiş Tarihi	Ara.17
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	97%
	Açıklama: Toplam 60 km uzunluğunda BY standartındadır. Yolun 43 Km'si Kahramanmaraş ili sınırlarındadır. 2016 yılı sonu itibarıyla toplam 58,6 km'lik (4,6 km si aşınma) kısmı BY-BSK olarak tamamlanmıştır. Kalan 1,4 Km BY-BSK ve Aşınma tabakasının ikmal ihalesi yapılması gerekmektedir. İkmal işinin proje bedeli 40.000.000 TL'dir	

## TCDD 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Proje Adı: Türkoğlu Lojistik Merkezi Yapımı	Proje Tutarı	59.404.027
	Başlangıç Tarihi	3.12.2014
	Bitiş Tarihi	30.06.2017
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	95%
	Açıklama: Alt yapı işleri tamamlanmış olup Lojistik merkez iç ve bağlantı yolları yapımı tamamlanarak 2017 yılı içerisinde hizmete verilmesi planlanmaktadır.	


Proje Adı: Türkoğlu Lojistik Merkezi Yapımı üst yapı bağlantısı işi	Proje Tutarı	4.500.000
	Başlangıç Tarihi	30.06.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	20%
	Parasal Gerçekleşme	10%
	Açıklama: Çalışmalar Devam Ediyor 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.	

Proje Adı:Köprüağzı Müsellesi Etüt proje mühendislik ve danışmanlık hizmet alımı işi	Proje Tutarı	443.387
	Başlangıç Tarihi	İhale Aşamasında
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	0
	Parasal Gerçekleşme	0
	Açıklama: İhale Aşamasında	


Proje Adı: Narlı-Sanko Çimento Fabrikası İltisak Hattı üst yapı yapım işi	Proje Tutarı	651.132
	Başlangıç Tarihi	30.06.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	25%
	Parasal Gerçekleşme	20%
	Açıklama: çalışmalar Devam Ediyor 2017 Yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.	

## DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı: Afşin İlçesi İçmesuyu Tesisleri	Proje Tutarı	100.000.000
	Başlangıç Tarihi	5.05.2017
	Bitiş Tarihi	30.12.2019
	Fiziki Gerçekleşme	18%
	Parasal Gerçekleşme	18%
	Açıklama: Afşin ilçesi, Altınelma, Tanır, Bakraç, Çobanbeyli, Arıtaş ve Çolhan yerleşim yerleri ile 24 mahallenin yıllık 16 milyon m <sup>3</sup> içme ve kullanma suyu ihtiyacı Hurman Çayı yatağındaki Kurudere kaynaklarından karşılanacaktır.	

Proje Adı: Andırın Geben Barajı	Proje Tutarı	40.000.000
	Başlangıç Tarihi	25.04.2017
	Bitiş Tarihi	26.03.2019
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: Barajın temelden yüksekliği 40 metre ve su biriktirme hacmi 18,95 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. Baraj, 39 100 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	


Proje Adı: Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım	Proje Tutarı	300.000.000
	Başlangıç Tarihi	16.09.2013
	Bitiş Tarihi	14.09.2017
	Fiziki Gerçekleşme	77
	Parasal Gerçekleşme	77
	Açıklama: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinde toplam 1 060 910 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak iletim hattı yapılmaktadır.	


Proje Adı: Kılavuzlu Sulaması 2. Kısım	Proje Tutarı	250.000.000
	Başlangıç Tarihi	19.09.2016
	Bitiş Tarihi	19.09.2019
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: 180 370 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır	

Proje Adı: Adatepe Sulaması 1. Kısım	Proje Tutarı	350.000.000
	Başlangıç Tarihi	8.09.2015
	Bitiş Tarihi	24.03.2019
	Fiziki Gerçekleşme	17
	Parasal Gerçekleşme	17
	Açıklama: 67 880 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır	



<b>Proje Adı: Adatepe Sulaması 2. Kısım</b>	<b>Proje Tutarı</b>	65.000.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	24.11.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	14.11.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: 59 460 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır</b>	

<b>Proje Adı: Adatepe Barajı Sulaması 3. Kısım</b>	<b>Proje Tutarı</b>	250.000.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	8.02.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	30.12.2020
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: 112 520 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır</b>	

<b>Proje Adı: Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım</b>	<b>Proje Tutarı</b>	70.000.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	23.02.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	13.02.2019
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	1
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	1
	<b>Açıklama: 22 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır</b>	

<b>Proje Adı: Andırın Çığşar Göleti ve Sulaması</b>	<b>Proje Tutarı</b>	15.000.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2.06.2015
RESİM	<b>Bitiş Tarihi</b>	30.12.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: temelden yüksekliği 34,5 metre ve su biriktirme hacmi 2 milyon m<sup>3</sup> olacaktır. 3 830 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir</b>	



Proje Adı: Andırın Hapisağzı Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	15.000.000
	Başlangıç Tarihi	4.06.2013
	Bitiş Tarihi	30.12.2018
	Fiziki Gerçekleşme	69
	Parasal Gerçekleşme	69
	Açıklama: temelden yüksekliği 31 metre ve su biriktirme hacmi 1,35 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 3 600 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

Proje Adı: Andırın Geben Kaleboynu Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	17.000.000
	Başlangıç Tarihi	23.03.2017
	Bitiş Tarihi	16.06.2018
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: temelden yüksekliği 42 metre ve su biriktirme hacmi 725 000 m <sup>3</sup> olacaktır. 2 050 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	



Proje Adı: Çağlayancerit Düzbağ Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	10.000.000
	Başlangıç Tarihi	26.11.2012
	Bitiş Tarihi	16.04.2018
	Fiziki Gerçekleşme	48
	Parasal Gerçekleşme	48
	Açıklama: temelden yüksekliği 30 metre ve su biriktirme hacmi 800 000 m <sup>3</sup> olacaktır. 1 640 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

RESİM


Proje Adı: Çağlayancerit Zeynepuşağı Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	11.000.000
	Başlangıç Tarihi	22.04.2013
	Bitiş Tarihi	30.12.2018
	Fiziki Gerçekleşme	30
	Parasal Gerçekleşme	30
	Açıklama: temelden yüksekliği 33 metre ve su biriktirme hacmi 1 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 1 710 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	




Proje Adı: Dulkadiroğlu Ağabeyli Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	41.000.000
	Başlangıç Tarihi	15.02.2017
	Bitiş Tarihi	11.05.2018
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: temelden yüksekliği 32 metre ve su biriktirme hacmi 1,49 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 2 830 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	


RESİM


Proje Adı: Dulkadirođlu Çokyařar Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	13.000.000
	Başlangıç Tarihi	29.06.2016
	Bitiş Tarihi	16.12.2018
	Fiziki Gerçekleşme	8
	Parasal Gerçekleşme	8
RESİM	Açıklama: temelden yüksekliđi 35 metre ve su biriktirme hacmi 1,14 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 1 530 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

Proje Adı: Göksun Bozhüyük Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	20.000.000
	Başlangıç Tarihi	23.03.2017
	Bitiş Tarihi	16.06.2018
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: temelden yüksekliđi 32 metre ve su biriktirme hacmi 768 000 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 2 100 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

Proje Adı: Göksun Büyükkızılıcık Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	10.000.000
	Başlangıç Tarihi	27.02.2015
	Bitiş Tarihi	26.02.2018
	Fiziki Gerçekleşme	6
	Parasal Gerçekleşme	6
	Açıklama: temelden yüksekliđi 32,5 metre ve su biriktirme hacmi 1,1 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 1 860 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	


Proje Adı: Göksun Büyükkızılıcık Güller Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	10.000.000
	Başlangıç Tarihi	25.10.2016
	Bitiş Tarihi	18.01.2018
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama: temelden yüksekliđi 36,7 metre ve su biriktirme hacmi 598 000 m <sup>3</sup> olacaktır. 1 740 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

Proje Adı: Nurhak Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	13.000.000
	Başlangıç Tarihi	9.05.2016
	Bitiş Tarihi	26.10.2018
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: temelden yüksekliđi 33,25 metre ve su biriktirme hacmi 1,73 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 2 490 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	


Proje Adı: Nurhak Kullar Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	15.000.000
	Başlangıç Tarihi	19.12.2014
	Bitiş Tarihi	25.04.2018
	Fiziki Gerçekleşme	13
	Parasal Gerçekleşme	13
	Açıklama: temelden yüksekliği 54 metre ve su biriktirme hacmi 1,37 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 3 060 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	


Proje Adı: Onikişubat Kumarlı Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	22.000.000
	Başlangıç Tarihi	8.04.2015
RESİM	Bitiş Tarihi	30.12.2018
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: temelden yüksekliği 42,5 metre ve su biriktirme hacmi 2,02 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 8 170 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

Proje Adı: Pazarcık Büyüknacar Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	11.000.000
	Başlangıç Tarihi	4.12.2018
RESİM	Bitiş Tarihi	22.05.2018
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: temelden yüksekliği 35 metre ve su biriktirme hacmi 790 000 m <sup>3</sup> olacaktır. 1 430 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

Proje Adı: Türkoğlu İmalî Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	20.000.000
	Başlangıç Tarihi	11.11.2016
	Bitiş Tarihi	4.07.2018
	Fiziki Gerçekleşme	6
	Parasal Gerçekleşme	6
	Açıklama: temelden yüksekliği 37 metre ve su biriktirme hacmi 2,55 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. 3 740 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

Proje Adı: Çağlayancerit Düzbağ Kuzgunkayası Göleti Sulaması	Proje Tutarı	5.000.000
	Başlangıç Tarihi	26.05.2015
RESİM	Bitiş Tarihi	17.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	94
	Parasal Gerçekleşme	94
	Açıklama: temelden 25 yüksekliği metre ve su biriktirme hacmi 3,2 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. Gölet, 4 000 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

Proje Adı: Dulkadirođlu Bařderviř Göleti ve Sulaması	Proje Tutarı	10.000.000
	Başlangıç Tarihi	24.03.2017
	Bitiř Tarihi	17.06.2018
	Fiziki Gerçekleřme	
	Parasal Gerçekleřme	
	Açıklama: Göletin temelden yüksekliđi 25 metre ve su biriktirme hacmi 1,01 milyon m <sup>3</sup> olacaktır. Gölet, 1 870 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir	

Proje Adı: Gökşun Çardak Göleti Sulaması	Proje Tutarı	16.000.000
	Başlangıç Tarihi	17.04.2014
	Bitiř Tarihi	30.12.2017
	Fiziki Gerçekleřme	97
	Parasal Gerçekleřme	97
	Açıklama: Toplam 14 070 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Cazibe ile sulanabilen 1 350 dekarlık kısım sulamaya açılmıştır. Pompajla sulanabilecek kısım inřaatı devam etmektedir	


Proje Adı: Çađlayancerit Zorkun Barajı Sulaması	Proje Tutarı	7.000.000
	Başlangıç Tarihi	20.05.2013
RESİM	Bitiř Tarihi	30.12.2017
	Fiziki Gerçekleřme	83
	Parasal Gerçekleřme	83
	Açıklama: 1 930 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır	

Proje Adı: Elbistan Sarsap Göleti sulaması	Proje Tutarı	9.000.000
	Başlangıç Tarihi	24.03.2017
RESİM	Bitiř Tarihi	30.12.2017
	Fiziki Gerçekleřme	37
	Parasal Gerçekleřme	37
	Açıklama: 5 570 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır	

Proje Adı: Dulkadirođlu Aksu Mahallesi Kuru Dere Islahı 2. Kısım	Proje Tutarı	600.000
	Başlangıç Tarihi	2.01.2017
	Bitiř Tarihi	7.06.2017
	Fiziki Gerçekleřme	100%
	Parasal Gerçekleřme	100%
	Açıklama: Aksu Mahallesi taşkınlardan korunmuřtur.	



Proje Adı: Dulkadirođlu Eyüp Sultan Cici ve Kerhan Dereleri Islahı	Proje Tutarı	8.000.000
	Başlangıç Tarihi	5.08.2016
	Bitiş Tarihi	29.10.2017
	Fiziki Gerçekleşme	67
	Parasal Gerçekleşme	67
	Açıklama: 2 mahalle taşkınlardan korunacaktır.	
RESİM		

Proje Adı: Elbistan Söğütlü Çayı Islahı	Proje Tutarı	13.000.000
	Başlangıç Tarihi	18.04.2017
	Bitiş Tarihi	19.03.2019
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: Elbistan ilçe merkezi taşkınlardan korunacaktır	
		

Proje Adı: Göksun Kanlıkavak Mahallesi Üvezli ve Kocaötek Dereleri Islahı	Proje Tutarı	1.200.000
	Başlangıç Tarihi	14.12.2016
	Bitiş Tarihi	13.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	38
	Parasal Gerçekleşme	38
	Açıklama: Kanlıkavak Mahallesi taşkınlardan korunacaktır.	
RESİM		

Proje Adı: Onikişubat Domuz (Boğaz), İğdeliöz (Kazmamusluğu) ve Ağcalı Dereleri Islahı	Proje Tutarı	7.000.000
	Başlangıç Tarihi	14.10.2015
	Bitiş Tarihi	13.10.2017
	Fiziki Gerçekleşme	46
	Parasal Gerçekleşme	46
	Açıklama: 2 mahalle taşkınlardan korunacaktır.	
RESİM		


Proje Adı: Onikişubat Domuz (Boğaz) Deresi Islahı 2. Kısım	Proje Tutarı	4.000.000
	Başlangıç Tarihi	6.03.2017
	Bitiş Tarihi	11.11.2017
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: 1 mahalle taşkınlardan korunacaktır.	
RESİM		


Proje Adı: Onikişubat Fatih Kasabası Deliçay Deresi ve Kolları Islahı 2. Kısım	Proje Tutarı	3.200.000
	Başlangıç Tarihi	13.10.2016
	Bitiş Tarihi	25.02.2018
	Fiziki Gerçekleşme	84
	Parasal Gerçekleşme	84
	Açıklama: 1 mahalle taşkınlardan korunacaktır.	
RESİM		

Proje Adı: Onikişubat Hacıağalar Mahallesi Gedikli Deresi Islahı	Proje Tutarı	1.500.000
	Başlangıç Tarihi	12.01.2017
	Bitiş Tarihi	8.11.2017
	Fiziki Gerçekleşme	14
	Parasal Gerçekleşme	14
	Açıklama: Hacıağalar Mahallesi taşkınlardan korunacaktır.	
RESİM		

Proje Adı: Onikişubat Kuşaklama Kanalı	Proje Tutarı	7.500.000
	Başlangıç Tarihi	5.01.2016
	Bitiş Tarihi	4.01.2018
	Fiziki Gerçekleşme	69
	Parasal Gerçekleşme	69
	Açıklama: Kahramanmaraş şehir merkezi taşkınlardan korunacaktır	
		

Proje Adı: Onikişubat Menzelet Barajı Sapçağın Deresi Islahı	Proje Tutarı	5.000.000
	Başlangıç Tarihi	10.02.2017
	Bitiş Tarihi	25.06.2018
	Fiziki Gerçekleşme	21
	Parasal Gerçekleşme	21
	Açıklama: Menzelet Barajı taşkınlardan korunacaktır	
		

Proje Adı: Pazarcık İncirli Deresi Islahı	Proje Tutarı	2.500.000
	Başlangıç Tarihi	25.08.2016
	Bitiş Tarihi	30.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	60
	Parasal Gerçekleşme	60
	Açıklama: Pazarcık ilçe merkezi taşkınlardan korunacaktır	
		


<b>Proje Adı: Pazarcık Mezere Mahallesi Yüzey Suları Kontrolü</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.500.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	24.04.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	16.09.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: Mezere Mahallesi taşkınlardan korunacaktır</b>	

<b>Proje Adı: Türkoğlu Çakmak, Helder, Kara ve kuyu Dereleri Islahı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	7.000.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	3.11.2016
<b>RESİM</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>	4.10.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: Hopurlu, Yeşilyöre, Kırmakaya ve Yolderesi mahalleleri taşkınlardan korunacaktır.</b>	


<b>Proje Adı: Türkoğlu Uzunsöğüt Mahallesi Ak ve Hopuriçi Deresi Islahı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	3.500.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	19.09.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	1.02.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	26
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	26
	<b>Açıklama: Uzunsöğüt Mahallesi taşkın zararlarından korunacaktır.</b>	

<b>Proje Adı: Türkoğlu Yeşilyurt Kuru Dere 1-2 ve Sazak Deresi Islahı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	600.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	12.12.2016
<b>RESİM</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>	23.06.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	24
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	24
	<b>Açıklama: Yeşilyurt Mahallesi taşkın zararlarından korunacaktır.</b>	


## KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı: Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	Proje Tutarı	3.455.000
	Başlangıç Tarihi	15.04.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	50%
	Parasal Gerçekleşme	22%
	Açıklama: Proje Herhangi bir sorun yoktur. Projeye ilgili çalışmalar devam etmektedir ve proje % 50 oranında tamamlanmıştır.	

Proje Adı: Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	Proje Tutarı	14.665.782
	Başlangıç Tarihi	1.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	30%
	Parasal Gerçekleşme	11%
	Açıklama: Herhangi bir sorun yoktur. Projeye ilgili çalışmalar devam etmektedir ve proje % 30 oranında tamamlanmıştır.	

Proje Adı: Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (Yeni Yol)	Proje Tutarı	2.796.000
	Başlangıç Tarihi	15.04.2017
	Bitiş Tarihi	30.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	26%
	Parasal Gerçekleşme	23%
	Açıklama: Herhangi bir sorun yoktur. Projeye ilgili çalışmalar devam etmektedir ve proje % 26 oranında tamamlanmıştır.	

Proje Adı: Üretim Faaliyetleri	Proje Tutarı	8.653.691
	Başlangıç Tarihi	1.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	36%
	Parasal Gerçekleşme	16%
	Açıklama: Herhangi bir sorun yoktur. Projeye ilgili çalışmalar devam etmektedir ve proje % 36 oranında tamamlanmıştır.	

Proje Adı: ORKÖY	Proje Tutarı	2.809.000
	Başlangıç Tarihi	1.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	19%
	Parasal Gerçekleşme	35%
	Açıklama: Herhangi bir sorun yoktur. Projeye ilgili çalışmalar devam etmektedir ve proje % 19 oranında tamamlanmıştır.	



## KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Proje Adı: Andırın Hükümet Konağı İnşaatı Yapım İşi	Proje Tutarı	3.854.529
	Başlangıç Tarihi	11.02.2014
	Bitiş Tarihi	06.06.2016
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	100%
	Açıklama: Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 100 oranında tamamlanmıştır.	

Proje Adı: Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakam Evleri Yapım İşi	Proje Tutarı	2.084.353
	Başlangıç Tarihi	23.05.2016
	Bitiş Tarihi	22.02.2017
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	100%
	Açıklama: Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 100 oranında tamamlanmıştır.	

Proje Adı: Elbistan Hükümet Konağı İkmal İnşaatı Yapım İşi	Proje Tutarı	5.084.255
	Başlangıç Tarihi	04.09.2015
	Bitiş Tarihi	12.04.2017
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	95%
	Açıklama: Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 100 oranında tamamlanmıştır.	

Proje Adı: Pazarcık Hükümet Konağı Yapım İşi	Proje Tutarı	7.219.240
	Başlangıç Tarihi	02.06.2017
RESİM	Bitiş Tarihi	03.12.2018
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	0%
	Açıklama: Yer teslimi yapıldı, yapı ruhsatı alındıktan sonra işe başlanılacak.	

Proje Adı: Türkoğlu Hükümet Konağı Yapım İşi	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
RESİM	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: 10.07.2017 tarihinde ihale edildi, kesinleşen ihale kararı 03.08.2017 tarihinde isteklilere tebliğ edildi.	

## KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı: Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Proje Tutarı	7.250.000
	Başlangıç Tarihi	15.06.2015
	Bitiş Tarihi	17.07.2017
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	95%



**Proje Adı: Kahramanmaraş Sosyal Hizmetler Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi**

<b>Proje Tutarı</b>	4.199.000,00
<b>Başlangıç Tarihi</b>	17.03.2016
<b>Bitiş Tarihi</b>	17.07.2017
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	65%
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	55%



**Açıklama:**Yapım Çalışmaları Devam etmektedir.

**Proje Adı: Kahramanmaraş Göksun Gücü Mahallesi Kırsal Dönüşüm Projesi Köy Tipi Evler ve Sosyal Tesis Yapım İşi.**

<b>Proje Tutarı</b>	12.990.000,00
<b>Başlangıç Tarihi</b>	24.11.2015
<b>Bitiş Tarihi</b>	31.01.2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	78%
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	75%



**Açıklama:**Yapım Çalışmaları Devam etmektedir.

## İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı: Sürdürülebilir Bitkisel Üretim Tekniklerinin Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Prj.	Proje Tutarı	55.513
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	68%
	Parasal Gerçekleşme	68%
	RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

Proje Adı: Su Ürünleri Sektöründe Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi	Proje Tutarı	33.431
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	71%
	Parasal Gerçekleşme	71%
	RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

Proje Adı: Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	Proje Tutarı	158.256
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	50%
	Parasal Gerçekleşme	50%
	RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

Proje Adı: Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	Proje Tutarı	63.874
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	62%
	Parasal Gerçekleşme	62%
	RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

Proje Adı: Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi	Proje Tutarı	43.077
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	63%
	Parasal Gerçekleşme	63%
	RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

Proje Adı: Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliği Kontrolü Projesi	Proje Tutarı	3.996
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	50%
	Parasal Gerçekleşme	50%
	RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

<b>Proje Adı: Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Projesi</b>	<b>Proje Tutarı</b>	10.188
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	99%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	99%
	<b>RESİM</b>	<b>Açıklama:</b> Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

<b>Proje Adı: Hayvancılığı Geliştirme Projesi</b>	<b>Proje Tutarı</b>	26.639
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	64
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	64
	<b>RESİM</b>	<b>Açıklama:</b> Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

<b>Proje Adı: Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi</b>	<b>Proje Tutarı</b>	8.881
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	76
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	76
	<b>RESİM</b>	<b>Açıklama:</b> Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

<b>Proje Adı: Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi</b>	<b>Proje Tutarı</b>	6.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	99
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	99
	<b>RESİM</b>	<b>Açıklama:</b> Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.



Proje Adı: Tarım Arazileri Edindirme ve Yönetimi Projesi	Proje Tutarı	43.249
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	10
	Parasal Gerçekleşme	10
RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.	

Proje Adı: Gıda ve Yem Numunesi Alma Hizmetlerini Geliştirme Projesi	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	40
	Parasal Gerçekleşme	40
RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.	

Proje Adı: Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi	Proje Tutarı	168.612
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	32
	Parasal Gerçekleşme	32
RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.	

Proje Adı: Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi	Proje Tutarı	86.847
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	20
	Parasal Gerçekleşme	20
RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.	

Proje Adı: Merkez Ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Prj.	Proje Tutarı	225.397
	Başlangıç Tarihi	01.01.2017
	Bitiş Tarihi	31.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	51
	Parasal Gerçekleşme	51
RESİM	Açıklama: Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.	

<b>Proje Adı: AB Yeşil Tarım Uygulamalarının Uyumlaştırılması Prj.</b>	<b>Proje Tutarı</b>	2.416
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	99
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	99
	<b>RESİM</b>	<b>Açıklama:</b> Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

<b>Proje Adı: Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Prj.</b>	<b>Proje Tutarı</b>	816
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	20
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	20
	<b>RESİM</b>	<b>Açıklama:</b> Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

<b>Proje Adı: Entegre İdare Kontrol Sistemi Prj.</b>	<b>Proje Tutarı</b>	145.155
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	89
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	89
	<b>RESİM</b>	<b>Açıklama:</b> Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

<b>Proje Adı: Tohumculuğun Geliştirilmesi Prj.</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.734
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	99
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	99
	<b>RESİM</b>	<b>Açıklama:</b> Tarımsal Faaliyetlerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar devam etmektedir. Proje yıl sonu itibari ile tamamlanacaktır.

# İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

## AFŞİN İLÇESİ

<b>Proje Adı:YEŞİLYURT MH. İLKOKULU</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	2.525.554,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	14.08.2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.05.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	88%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 88 oranında tamamlanmıştır.	

<b>Proje Adı:İMAM HATİP LİSESİ VE PANSİYONU</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	7.051.706,22 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	23.01.2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	13.12.2016
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	88%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 88 oranında tamamlanmıştır.	

<b>Proje Adı: MESLEKİ VE TEKNİK LİSE</b>  <b>RESİM</b>	<b>Proje Tutarı</b>	7.019.820,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	6.07.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	29.09.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b>	

<b>Proje Adı: ORTAÖĞRETİM PANSİYONU( ARITAŞ ÖZTÜRK ÇPL</b>  <b>RESİM</b>	<b>Proje Tutarı</b>	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b>	

<b>Proje Adı: AFŞİN ANAOKULU</b>  <b>RESİM</b>	<b>Proje Tutarı</b>	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b>	

Proje Adı: ERÇENE İLKOKULU	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama:	
Proje Adı: KABAĞAÇ İLKOKULU	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama:	
Proje Adı: CUMA ÇELİK İLKOKULU	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama:	

## ANDIRIN İLÇESİ

Proje Adı: Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Anadolu Lisesine Atolye Yapımı	Proje Tutarı	2.130.000,00 TL
	Başlangıç Tarihi	21.07.2016
	Bitiş Tarihi	17.05.2017
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	0%
RESİM	Açıklama: Proje Zemin Etütünde sağlam çıkmadığından dolayı durdurulmuştur.	

Proje Adı: İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu (2015)	Proje Tutarı	15.200.000,00 TL
	Başlangıç Tarihi	4.02.2017
	Bitiş Tarihi	30.11.2019
	Fiziki Gerçekleşme	0,00 TL
	Parasal Gerçekleşme	0%
	Açıklama: Bina yapımına yeni başlanmıştır.	

Proje Adı: Küçükcerit İlkokulu (2017)	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama: Proje yapımına henüz başlanmamıştır.	


## DULKADIROĞLU İLÇESİ

<b>Proje Adı: Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi Okul Binası</b>	<b>Proje Tutarı</b>	11.378.740,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	28.06.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	18.02.2019
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	30%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	Bilinmiyor
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 30 oranında tamamlanmıştır.	






<b>Proje Adı: Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi Pansiyon Binası</b>	<b>Proje Tutarı</b>	11.378.740,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	28.06.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	18.02.2019
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	30%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	Bilinmiyor
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 30 oranında tamamlanmıştır.	

<b>Proje Adı: Anadolu Lisesi (Yahya Kemal Mahallesi)</b>	<b>Proje Tutarı</b>	6.475.840,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	23.05.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	16.08.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	90%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	47.6%
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 90 oranında tamamlanmıştır.	

<b>Proje Adı: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası</b>	<b>Proje Tutarı</b>	3.912.000,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	16.09.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	1.09.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	85%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	64.58%
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 85 oranında tamamlanmıştır.	

<b>Proje Adı: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binası</b>	<b>Proje Tutarı</b>	3.912.000,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	16.09.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	1.09.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	95%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	64.58%
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 95 oranında tamamlanmıştır.	



<b>Proje Adı: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	3.912.000,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	16.09.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	1.09.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	98%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	64.58%
<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 98 oranında tamamlanmıştır.		
<b>Proje Adı: Spor Salonu (Karacasu ÇPL)</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	1.648.342,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	8.03.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	13.11.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	30%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	14.70%
<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 30 oranında tamamlanmıştır.		
<b>Proje Adı: Sosyal Bilimler Lisesi Okul Binası</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	12.963.480,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	30.05.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	11.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	45%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	31.02%
<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 40 oranında tamamlanmıştır.		
<b>Proje Adı: Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Binası</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	12.963.480,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	30.05.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	11.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	45%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	31.02%
<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 40 oranında tamamlanmıştır.		
<b>Proje Adı: Baydemirli ÇPL ve Atölye ve Lojman</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	11.378.740,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	28.06.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	18.02.2019
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0%
<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatlarına başlanılmamıştır.		

## EKİNÖZÜ İLÇESİ

<b>Proje Adı:</b> Ekinözü ÇPAL Kız Öğrenci Yurdu	<b>Proje Tutarı</b>	3.636.760
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	23.05.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	27.06.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	65%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	26%
	<b>Bodrum+Zemin kat+2 Kat olan toplam 4 kattan oluşan 100 yataklı kız pansiyon yurdunun son katının tablası atım çalışmaları yapılmaktadır.</b>	

## ELBİSTAN İLÇESİ

<b>Proje Adı:</b> İsmetpaşa İlkokulu Elbistan	<b>Proje Tutarı</b>	4.230.000.00
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	1.04.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	9.02.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	40%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	%
	<b>Açıklama:</b>	

<b>Proje Adı:</b> Taşburun M. Topraktepe İlkokulu Elbistan	<b>Proje Tutarı</b>	3.550.000.00
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	20.09.2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	10.04.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	99%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 99 oranında tamamlanmıştır.	

<b>Proje Adı:</b> Alembey Mahallesi İlkokulu Elbistan	<b>Proje Tutarı</b>	1.549.000.00
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	28.10.2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	30.06.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	95%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b>	

<b>Proje Adı:</b> İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu ve Spor Salonu	<b>Proje Tutarı</b>	13.730.000.00
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	31.08.2015
	<b>Bitiş Tarihi</b>	19.11.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	80%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b>	

Proje Adı: Mesleki ve Teknik Lisesi ve 2 Atölye	Proje Tutarı	7.758.00.00
	Başlangıç Tarihi	16.09.2016
	Bitiş Tarihi	29.01.2018
	Fiziki Gerçekleşme	60%
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama:	
Proje Adı: Atölye Elbistan Mes. ve Tek. And. Lisesi Elbistan	Proje Tutarı	879.200.00
	Başlangıç Tarihi	13.08.2016
	Bitiş Tarihi	29.04.2017
	Fiziki Gerçekleşme	99%
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 99 oranında tamamlanmıştır.	

## GÖKSUN İLÇESİ

Proje Adı: Göksun Ortaöğretim Pansiyonu (300 kişilik)	Proje Tutarı	4.306.775.00 TL
	Başlangıç Tarihi	28.08.2014
	Bitiş Tarihi	16.01.2016
	Fiziki Gerçekleşme	99%
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: Bina Teslim alınmıştır	

Proje Adı: Göksun Anadolu Lisesi	Proje Tutarı	4.739.000.00 TL
	Başlangıç Tarihi	31.03.2016
	Bitiş Tarihi	11.08.2017
	Fiziki Gerçekleşme	99%
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: Geçici kabul aşamasına gelmiştir.	

Proje Adı: Büyükkızılıç Güller İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
RESİM	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: 2017 yatırım programına alınmıştır.	

Proje Adı: 200 kişilik ortaöğretim pansiyonu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama: 17/03/2017 ihalesi yapıldı. İhale iptal edildi.	

Proje Adı: Yavuz Selim Orta/Anaokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama: 2017 yatırım programına alınmıştır.	

## NURHAK İLÇESİ

Proje Adı: Nurhak ÇPL ve Atölye	Proje Tutarı	5.337.140
	Başlangıç Tarihi	6.06.2017
	Bitiş Tarihi	20.10.2018
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	0%
	Açıklama:	



Proje Adı:Ortaöğretim Pansiyonu (2015)	Proje Tutarı	6289400
	Başlangıç Tarihi	6.06.2017
	Bitiş Tarihi	31.08.2018
	Fiziki Gerçekleşme	0
	Parasal Gerçekleşme	0
	Açıklama:	




Proje Adı: ATÖLYE	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama:	






## ONİKİŞUBAT İLÇESİ

<b>Proje Adı: CUMHURİYET ANAOKULU</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.970.000,00.-TL.
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	21.07.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	17.05.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	94,26%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	94,26%
	<b>Açıklama:</b> İnşaat tamamlanmış olup, geçici kabul yapılacaktır.	

<b>Proje Adı: Kale Kesmelitepe Ortaokulu</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.013.900,00.-TL.
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	18.11.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	25.07.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	94,26%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	94,26%
	<b>Açıklama:</b> İnşaat tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasına gelinmiştir.	

<b>Proje Adı: Hartlap ÇPL ( Atölye Binası )</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.414.000,00.-TL.
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	25.08.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	02.05.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	75,58%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	75,58%
	<b>Açıklama:</b> İnşaat %80 oranında tamamlanmıştır.	

<b>Proje Adı: Binevler Anadolu Lisesi</b>	<b>Proje Tutarı</b>	7.615.331,84.-TL.
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	30.05.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	12.10.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	41,64%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	41,64%
	<b>Açıklama:</b> devam eden proje	

<b>Proje Adı: Hacılar İlkokulu Lojman Yapımı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	915.500,00.-TL.
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	04.10.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	21.06.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	66,81%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	66,81%
	<b>Açıklama:</b> devam eden proje	



<b>Proje Adı: Sarıgözel Ali Koca İlkokulu Lojman Yapımı</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	1.271.000,00.-TL.
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	05.12.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	01.10.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	53,51%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	53,51%
	<b>Açıklama:</b> devam eden proje	

<b>Proje Adı: Anadolu Lisesi ( Maarif Mahallesi )</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> İnşaat çalışması başlamamıştır.	

<b>Proje Adı: Şehit Galip Özmen Mes.ve Tek.And.Lis. ( Atölye İnşaatı )</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	2.708.100,00 TL
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	19.06.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	23.02.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	0,26%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0,26%
	<b>Açıklama:</b> İnşaat için kazı çalışmaları yeni başlamıştır.	

<b>Proje Adı: Fatih Anadolu Lisesi ( Spor Salonu )</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	682.668,16.-TL.
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	30.05.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	12.10.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	19,36%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	19,36%
	<b>Açıklama:</b> devam eden proje	

<b>Proje Adı: Onikişubat Belediyesi İmam Hatip O.O. ( Kale )</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	1.297.000,00.-TL.
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	15.03.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	09.03.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	99
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	99
	<b>Açıklama:</b> Okul inşaatı tamamlanmış olup, teslimat yapılmamıştır.	

<b>Proje Adı: Onikişubat Belediyesi İmam Hatip O.O. Pansiyonu( Kale )</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	1.170.000,00.-TL.
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	15.03.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	15.03.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	99
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	99
	<b>Açıklama:</b> Yurt binası tamamlanmış olup, teslimat yapılmamıştır.	

<b>Proje Adı: Dumlupınar İlkokulu</b>	<b>Proje Tutarı</b>	8.474.000,00.-TL.
---------------------------------------	---------------------	-------------------

Proje Adı: Dumlupınar İlkokulu



Başlangıç Tarihi	25.05.2017
Bitiş Tarihi	07.12.2018
Fiziki Gerçekleşme	
Parasal Gerçekleşme	
Açıklama:	İnşaat yapımı başlamamıştır.

Proje Adı: İHL ve Pansiyon ve S.S.( Karamalı Mahallesi )



Proje Tutarı	
Başlangıç Tarihi	
Bitiş Tarihi	
Fiziki Gerçekleşme	
Parasal Gerçekleşme	
Açıklama:	Yapımına başlamamıştır.

Proje Adı: Spor Salonu ( Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi )



Proje Tutarı	
Başlangıç Tarihi	19.06.2017
Bitiş Tarihi	23.02.2018
Fiziki Gerçekleşme	
Parasal Gerçekleşme	
Açıklama:	Yapımına başlanmamıştır.

Proje Adı: AB Şehit Abdullah Çavuş Mah. İlkokulu ( Çiğdem Anaokulu Bitişiği)



Proje Tutarı	
Başlangıç Tarihi	
Bitiş Tarihi	
Fiziki Gerçekleşme	
Parasal Gerçekleşme	
Açıklama:	

Proje Adı: AB Necip Fazıl Kısakürek Mah. İlkokulu ( Yatılı Bölge Lojmanları )



Proje Tutarı	
Başlangıç Tarihi	
Bitiş Tarihi	
Fiziki Gerçekleşme	
Parasal Gerçekleşme	
Açıklama:	

Proje Adı: AB Haydarbey Mahallesi İlkokulu



Proje Tutarı	
Başlangıç Tarihi	
Bitiş Tarihi	
Fiziki Gerçekleşme	
Parasal Gerçekleşme	
Açıklama:	

Proje Adı: Fatih Sultan Mehmet İlkokulu




Proje Tutarı	
Başlangıç Tarihi	





Bitiş Tarihi	
Fiziki Gerçekleşme	
Parasal Gerçekleşme	
Açıklama:	

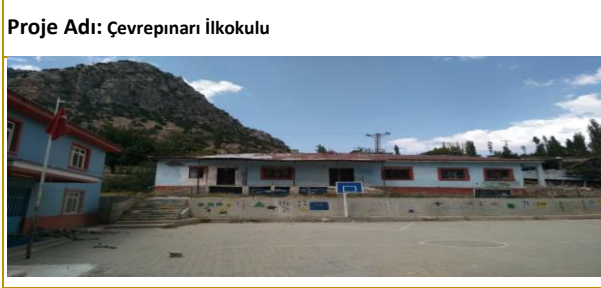


Proje Adı: Çevrepinarı İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama:	



Proje Adı: Kılavuzlu Mahallesi İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama:	




Proje Adı: Binevler Mahallesi İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama:	

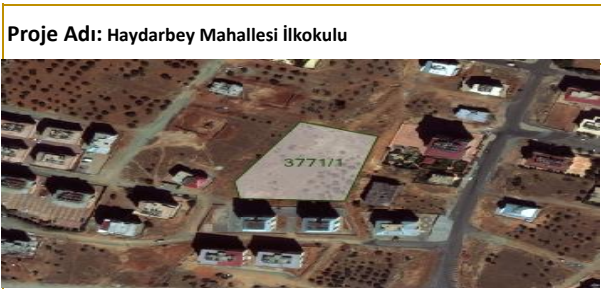

Proje Adı: Haydarbey Mahallesi İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama:	



Proje Adı: Selimiye Mahallesi İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: Yapılacak taşınmaz kesinlik kazanmamıştır.	



Proje Adı: Ilıca Yeniyanan Mahallesi İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	



Fiziki Gerçekleşme	
Parasal Gerçekleşme	
Açıklama:	



Proje Adı: Fatmalı Mahallesi İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama:	



Proje Adı: Köseli Ortaokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama:	



Proje Adı: Atatürk And. ve Pans. ve S.S.	Proje Tutarı	10.785.002,70 TL
	Başlangıç Tarihi	12.01.2015
	Bitiş Tarihi	31.07.2017
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	100%
	Açıklama: geçici kabulü yapıldı	



Proje Adı: İHL ve Pansiyonu (Pınarbaşı M.)	Proje Tutarı	10.303.524,00 TL
	Başlangıç Tarihi	12.01.2015
	Bitiş Tarihi	31.07.2017
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	100%
	Açıklama: geçici kabulü yapıldı	



Proje Adı: AGSL ve Pansiyonu (Pınarbaşı M.)	Proje Tutarı	11.157.195,28 TL
	Başlangıç Tarihi	6.02.2015
	Bitiş Tarihi	31.07.2017
	Fiziki Gerçekleşme	100%
	Parasal Gerçekleşme	100%
	Açıklama: geçici kabulü yapıldı	

## PAZARCIK İLÇESİ

Proje Adı: Pazarcık METEM Onarım ve Güçlendirme	Proje Tutarı	751.265,88 ₺
---	--------------	--------------

Proje Adı: Pazarcık METLİM Çarşını ve Güçlendirme



Başlangıç Tarihi	21.11.2016
Bitiş Tarihi	20.05.2017
Fiziki Gerçekleşme	8,68%
Parasal Gerçekleşme	8,68%
Açıklama: Devam Eden Proje.	

Proje Adı: Eğice İlk Okulu Orta Okulu



Proje Tutarı	1.320.420,00 ₺
Başlangıç Tarihi	11.10.2016
Bitiş Tarihi	9.05.2017
Fiziki Gerçekleşme	100%
Parasal Gerçekleşme	100%
Açıklama: Tamamlandı. ( Derslik Sayısı : 6 )	

Proje Adı: Pazarcık Anaokulu



Proje Tutarı	
Başlangıç Tarihi	
Bitiş Tarihi	
Fiziki Gerçekleşme	0%
Parasal Gerçekleşme	0%
Açıklama: Yeni Proje. ( Derslik Sayısı : 8 )	

Proje Adı: Sarıl İlkokulu



Proje Tutarı	
Başlangıç Tarihi	
Bitiş Tarihi	
Fiziki Gerçekleşme	0%
Parasal Gerçekleşme	0%
Açıklama: Yeni Proje. ( Derslik Sayısı : 12 )	

Proje Adı: Yumaklıcerit İlkokulu




Proje Tutarı	
Başlangıç Tarihi	
Bitiş Tarihi	
Fiziki Gerçekleşme	0%
Parasal Gerçekleşme	0%
Açıklama: Yeni Proje. ( Derslik Sayısı : 12 )	




Proje Adı: Tetirlik İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	0%
RESİM	Açıklama: Yeni Proje. ( Derslik Sayısı : 8 )	

Proje Adı: Salmanlı M. Mevsimlik İşçiler İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	0%
RESİM	Açıklama: Yeni Proje. ( Derslik Sayısı : 2 )	

## TÜRKOĞLU İLÇESİ

Proje Adı: Küçükimalı İlkokulu	Proje Tutarı	1.323.193 ₺
	Başlangıç Tarihi	2.04.2017
	Bitiş Tarihi	25.11.2017
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	0%
	Açıklama: Küçükimalı İlkokulu Projesinin temeli atılmış olup henüz inşaat aşamasındadır.	


Proje Adı: Kırmakaya İlkokulu	Proje Tutarı	-
	Başlangıç Tarihi	4.05.2017
	Bitiş Tarihi	8.06.2018
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	0%
	Açıklama: Kırmakaya İlkokulu Projesinin temeli atılmış olup henüz inşaat aşamasındadır.	


Proje Adı: ÇPL (Yeşilyöre Mah.)	Proje Tutarı	3.078.620,00 ₺
	Başlangıç Tarihi	7.04.2017
	Bitiş Tarihi	12.05.2018
	Fiziki Gerçekleşme	0%
	Parasal Gerçekleşme	0%
	Açıklama: Yeşilyöre Çok Programlı Lisesi Projesinin temeli kazılmış olup henüz inşaat başlamamıştır.	

Proje Adı: İstasyon M. İHO İkmal İnşaatı	Proje Tutarı	1.320.184,00 ₺
	Başlangıç Tarihi	27.03.2017
	Bitiş Tarihi	10.10.2017
	Fiziki Gerçekleşme	95%
	Parasal Gerçekleşme	17,83%
	Açıklama: İmam Hatip Ortaokulu binası %95 oranında tamamlanmış olup 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecektir.	

Proje Adı: İhl ve Pansiyonu	Proje Tutarı	14.620.200,00 ₺
	Başlangıç Tarihi	6.06.2017
	Bitiş Tarihi	22.03.2019
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: İmam Hatip lisesi Projesinin temel altı grobetonu dökülmüş olup henüz temel atılmamıştır.	

Proje Adı:Şehit Şeref Kılılı Yıldızkent Ortaokulu	Proje Tutarı	-
	Başlangıç Tarihi	30.06.2016
	Bitiş Tarihi	30.06.2017
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: Şehit Şeref Kılılı Yıldızkent Ortaokulu Projesi %85 oranında tamamlanmış olup 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecektir.	

Proje Adı: Atölye ve Spor Salonu (Balsuyu Ms. Tk. And. Ls.)	Proje Tutarı	2.937.020,00 ₺
	Başlangıç Tarihi	30.03.2017
	Bitiş Tarihi	24.01.2018
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: Atölye ve Spor Salonu (Balsuyu Ms. Tk. And. Ls.) projesinin temeli kazılmış olup henüz inşaat başlamamıştır.	

Proje Adı: Kılılı Balsuyu Ortaöğretim Pansiyonu	Proje Tutarı	8.732.000,00 ₺
	Başlangıç Tarihi	28.10.2016
	Bitiş Tarihi	2.12.2017
	Fiziki Gerçekleşme	70%
	Parasal Gerçekleşme	18,70%
	Açıklama: Kılılı Balsuyu Ortaöğretim Pansiyonu Projesi %70 oranında tamamlanmış durumdadır.	

Proje Adı: İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak Olan tölye (Balsuyu Ms. Tk. And. Ls.)	Proje Tutarı	0,00 ₺
	Başlangıç Tarihi	0.01.1900
	Bitiş Tarihi	0.01.1900
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
	Açıklama: İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak Olan Atölye (Balsuyu Ms. Tk. And. Ls.) projesinin temeli kazılmış olup henüz inşaat başlamamıştır.	

<b>Proje Adı: Balsuyu Endüstri Meslek Lisesi Atölye Yapımı</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	1.392.400,00 ₺
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	20.08.2014
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	70%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0
	<b>Açıklama: Balsuyu Endüstri Meslek Lisesi Atölye Yapımı Projesinin %70i tamamlanmıştır.</b>	

<b>Proje Adı: Spor Salonu Anadolu Lisesi</b>  RESİM	<b>Proje Tutarı</b>	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: Yeni Proje</b>	

<b>Proje Adı: AB Aşağısarılar Mah. İlkokulu</b>  RESİM	<b>Proje Tutarı</b>	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: Yeni Proje</b>	

<b>Proje Adı: Şekeoba Mah. Anaokulu</b>  RESİM	<b>Proje Tutarı</b>	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: Yeni Proje</b>	

<b>Proje Adı: Yolderesi İlkokulu</b>  RESİM	<b>Proje Tutarı</b>	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: Yeni Proje</b>	

<b>Proje Adı: Doluca Şehit Ali Can İlkokulu</b>  RESİM	<b>Proje Tutarı</b>	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama: Yeni Proje</b>	

Proje Adı: Uzunsöğüt İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama:	Yeni Proje

Proje Adı: Hopurlu Mah. Kayapınar İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama:	Yeni Proje

Proje Adı: Dedeler İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama:	Yeni Proje

Proje Adı: Ceceli Mah. Mevsimlik İşçiler İlkokulu	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama:	Yeni Proje

Proje Adı: Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi	Proje Tutarı	
	Başlangıç Tarihi	
	Bitiş Tarihi	
	Fiziki Gerçekleşme	
	Parasal Gerçekleşme	
RESİM	Açıklama:	Yeni Proje

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Adı: ELBİSTAN 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ EK BLOK İNŞAATI



Proje Tutarı	86.734.404
Başlangıç Tarihi	2.04.2014
Bitiş Tarihi	10.02.2017 (S.U.)
Fiziki Gerçekleşme	100%
Parasal Gerçekleşme	99%

Açıklama: Bina inşaatı tamamlandı. 28.02.2017 tarihinde Geçici Kabulü onaylandı. Bina hizmete açıldı.

Proje Adı: ANDIRIN TOPLUM SAĞ.MER.+AİLE SAĞ.MER.(6 HEKİMLİK)+112 ASH İSTASYONU



Proje Tutarı	1.628.400
Başlangıç Tarihi	11.03.2016
Bitiş Tarihi	18.10.2016 (S.U.)
Fiziki Gerçekleşme	100%
Parasal Gerçekleşme	90%

Açıklama: Zemin+1 katlı binanın imalatları tamamlandı. 06.03.2017 tarihinde Geçici Kabulü onaylandı. Bina hizmete açıldı.

Proje Adı: TÜRKÖĞLU 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ



Proje Tutarı	16.591.142
Başlangıç Tarihi	19.02.2016 (Şerhli)- 18.04.2016(Fiili)
Bitiş Tarihi	22.08.2017 (S.U.)
Fiziki Gerçekleşme	92%
Parasal Gerçekleşme	89%

Açıklama: Temel ve betonarme karkas inşaatı, duvar ve çatı imalatları bitti. Sıva, tesisat, dış cephe kaplama, çevre düzenlemesi ve asma tavan imalatları devam ediyor.

Proje Adı: ONİKİŞUBAT İLÇESİ SÜLEYMANLI SAĞLIK EVİ



Proje Tutarı	467.280
Başlangıç Tarihi	14.03.2016
Bitiş Tarihi	10.10.2016 (S.U.)
Fiziki Gerçekleşme	100%
Parasal Gerçekleşme	80%

Açıklama: Tek katlı binanın imalatları tamamlandı. 19.06.2017 tarihinde Geçici Kabulü onaylanarak bina hizmete açıldı.


Proje Adı: ELBİSTAN CEYHAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (6 HEKİMLİK)




Proje Tutarı	1.361.720
Başlangıç Tarihi	29.05.2017
Bitiş Tarihi	25.12.2017
Fiziki Gerçekleşme	0%
Parasal Gerçekleşme	0%

Açıklama: Elbistan Belediyesiindeki sorun çözüldükten sonra arazideki kot farkından dolayı proje değişikliği yapıldığından 29.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılmasına rağmen inşaat henüz başlamadı.




<b>Proje Adı: PAZARCIK NARLI AİLE SAĞ.MER. (7 HEKİMLİK)</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.352.280
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	1.06.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	27.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	40%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	7%
	<b>Açıklama:</b> Toplam 2 katlı binanın temel inşaatı ve zemin kat betonarme karkas inşaatı tamamlandı. 1.Kat betonarme karkas inşaatı devam ediyor.	

<b>Proje Adı: ONİKİŞUBAT MİMAR SİNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (6 HEKİMLİK)</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.322.780
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	25.05.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	21.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	40%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Açıklama:</b> Toplam 3 katlı binanın temel inşaatı ve zemin kat betonarme karkas inşaatı tamamlandı. 1.Kat betonarme karkas inşaatı devam ediyor.	

<b>Proje Adı: ELBİSTAN GARİPLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (6 HEKİMLİK)</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.750.000 (Tahmini)
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> 28.07.2017 tarihinde sözleşme imzalandı. Yer tesliminin yapılması bekleniyor.	

<b>Proje Adı: ANDIRIN GEBEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (1 HEKİMLİK-LOJMANLI)</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.378.240
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	1.08.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	26.02.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Açıklama:</b> 26.07.2017 tarihinde sözleşme imzalandı. 01.08.2017 tarihinde ise yer teslimi yapıldı.	

<b>Proje Adı: ÇAĞLAYANCERİT DÜZBAĞ AİLE SAĞ.MER. (2 HEKİMLİK-LOJMANLI)</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.130.440
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	28.07.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	22.02.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	5%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0%
	<b>Açıklama:</b> Toplam 2 katlı binanın temel inşaatı devam ediyor.	

<b>Proje Adı: NECİP FAZIL ŞEHİR HAST. 250 YATAKLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ EK BİNASI</b>	<b>Proje Tutarı</b>	100.000.000 (Tahmini)
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2019
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde devam etmektedir.	

<b>Proje Adı: PAZARCIK 125 YATAKLI DEVLET HASTANESİ</b>	<b>Proje Tutarı</b>	45.000.000 (Tahmini)
---	---------------------	----------------------

**Proje Adı: FAZLILIK 125 YATAKLI DEVLET HASTANESİ**

<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
<b>Bitiş Tarihi</b>	2019
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde devam etmektedir.	

**Proje Adı: ANDIRIN 30 YATAKLI DEVLET HASTANESİ**


<b>Proje Tutarı</b>	11.250.000 (Tahmini)
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde devam etmektedir.	

**Proje Adı: AFŞİN 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ**

<b>Proje Tutarı</b>	60.000.000 (Tahmini)
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2017
<b>Bitiş Tarihi</b>	2019
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde devam etmektedir.	

**Proje Adı: ELBİSTAN 25 ÜNİTLİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ**

<b>Proje Tutarı</b>	12.500.000 (Tahmini)
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde devam etmektedir.	

**Proje Adı: AFŞİN AİLE SAĞ.MER.(8 HEKİMLİK)+TOPLUM SAĞ.MER.**

<b>Proje Tutarı</b>	2.500.000 (Tahmini)
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde tamamlanarak ihaleye çıkılması için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.	


**Proje Adı: ONİKİŞUBAT TOPLUM SAĞ.MER. (SAĞLIKLI YAŞAM MER.)+5 NİSAN AİLE SAĞ.MER. (8 HEKİMLİK)**

<b>Proje Tutarı</b>	3.500.000 (Tahmini)
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde tamamlanarak ihaleye çıkılması için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.	

**Proje Adı: TÜRKÖĞLU AİLE SAĞ.MER. (6 HEKİMLİK) +**

<b>Proje Tutarı</b>	2.500.000 (Tahmini)
---------------------	---------------------




**TOPLUM SAĞ.MER.**

<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde tamamlanarak ihaleye çıkılması için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.	

**Proje Adı: DULKADİROĞLU YENİŞEHİR AİLE SAĞ.MER (10 HEK.)+SAĞLIKLIL YAŞ.MER.+112 ASH İSTASYONU**

<b>Proje Tutarı</b>	4.000.000 (Tahmini)
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2017
<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün 09.06.2017 tarih ve 1017 sayılı yazısı ile ek olarak 2017 Yatırım Programına alınmıştır. Proje işlemleri Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde devam ediyor.	

**Proje Adı: ONİKİŞUBAT YÖRÜKSELİM 37 NOLU GÖÇMEN SAĞ.MER.**

<b>Proje Tutarı</b>	1.252.000 (Tahmini)
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2017
<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> 2017 Yılı Yatırım Programına alındı. Kuveyt Hükümeti tarafından yapılacaktır. İşlemler Sağlık Bakanlığınca yürütülmektedir.	


**Proje Adı: ONİKİŞUBAT FATİH SERİNTEPE GÖÇMEN SAĞ.MER.**

<b>Proje Tutarı</b>	1.252.000 (Tahmini)
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2017
<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> 2017 Yılı Yatırım Programına alındı. Kuveyt Hükümeti tarafından yapılacaktır. İşlemler Sağlık Bakanlığınca yürütülmektedir.	

**Proje Adı: DULKADİROĞLU ŞEYHADİL 25 NOLU GÖÇMEN SAĞ.MER.**

<b>Proje Tutarı</b>	1.252.000 (Tahmini)
<b>Başlangıç Tarihi</b>	2017
<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
<b>Açıklama:</b> 2017 Yılı Yatırım Programına alındı. Kuveyt Hükümeti tarafından yapılacaktır. İşlemler Sağlık Bakanlığınca yürütülmektedir.	


<b>Proje Adı: ANDIRIN 112 ASH İSTASYONU</b>	<b>Proje Tutarı</b>	417.000 (Tahmini)
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tamamlanarak ihaleye çıkılması için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.	

<b>Proje Adı: ELBİSTAN KIZILCAOBA 112 ASH İSTASYONU</b>	<b>Proje Tutarı</b>	417.000 (Tahmini)
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tamamlanarak ihaleye çıkılması için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.	

<b>Proje Adı: ONİKİŞUBAT TEKİR 112 ASH İSTASYONU</b>	<b>Proje Tutarı</b>	417.000 (Tahmini)
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tamamlanarak ihaleye çıkılması için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.	



<b>Proje Adı: ONİKİŞUBAT AKÇAKOYUNLU 112 ASH İSTASYONU</b>	<b>Proje Tutarı</b>	417.000 (Tahmini)
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tamamlanarak ihaleye çıkılması için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.	

<b>Proje Adı: GÖKSUN 112 ASH İSTASYONU</b>	<b>Proje Tutarı</b>	417.000 (Tahmini)
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tamamlanarak ihaleye çıkılması için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.	

<b>Proje Adı: PAZARCIK NARLI 112 ASH İSTASYONU</b>	<b>Proje Tutarı</b>	417.000 (Tahmini)
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	
	<b>Açıklama:</b> Proje işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tamamlanarak ihaleye çıkılması için Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına gönderildi.	






## KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Proje Adı: Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlenmesi</b>	<b>Proje Tutarı</b>	9.287.000,00 TL	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	8.08.2016	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	25.12.2017	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	90%	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	85%	
	<b>Açıklama:</b>	Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 90 oranında tamamlanmıştır.	
<b>Proje Adı:Kahramanmaraş Elbistan Spor Salonu</b>	<b>Proje Tutarı</b>	11.753.000,00	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	22.02.2016	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	25.04.2018	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	50%	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	40%	
	<b>Açıklama:</b>	Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 50 oranında tamamlanmıştır.	
<b>Proje Adı:Kahramanmaraş Ekinözü Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası, 2'li Soyunma Odası, 500 Seyircili Tribün ve</b>	<b>Proje Tutarı</b>	1.128.172,44	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	5.11.2015	
	<b>Bitiş Tarihi</b>		
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	30%	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	30%	
	<b>Açıklama:</b>	İş tasfiye olmuş olup, yeni ihale süreci devam etmektedir.	
<b>Proje Adı:Kahramanmaraş Çağlayancerit Spor Salonu</b>	<b>Proje Tutarı</b>	3.646.000,00	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	7.07.2017	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	4.07.2019	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	3%	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0%	
	<b>Açıklama:</b>	Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 3 oranında tamamlanmıştır.	
<b>Proje Adı:Kahramanmaraş 12 Şubat Spor Kompleksi İçerisine Havalı Tabanca Atış Poligonu Yapımı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	432.206,00	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	30.09.2016	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	18.01.2017	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	100%	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	100%	
	<b>Açıklama:</b>	Anahtar Teslim olan binaların inşaatları % 100 oranında tamamlanmıştır.	

### İhale Sürecinde Olan İşler

1. Afşin Gençlik Merkezi (Spor Genel Müdürlüğümüzce ihale süreci devam etmektedir.)
2. Kamp Eğitim Merkezi (Spor Genel Müdürlüğümüzce ihale süreci devam etmektedir.)

## AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>ŞEHİT HAKAN DUYĞAL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	7.309.946	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	13.11.2013	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	18.01.2016	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	99%	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	100%	
	<b>Açıklama:</b> 154 kişi (70 kişi Rehabilitasyon Merkezi, 84 kişi Huzurevi) kapasitesi bulunan yeni binamız 01.06.2016 tarihinde yaşlı kabulüne başlamıştır.		
<b>ÇOCUKEVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  	<b>Proje Tutarı</b>	2.510.000,00	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	5.12.2013	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	8.04.2015	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	99%	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	100%	
	<b>Açıklama:</b> 60 Kişilik kapasite ile hizmet vermektedir		
<b>SHM+ İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>  	<b>Proje Tutarı</b>	4.955.000,00	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	24.03.2016	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	11.08.2017	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	65%	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	44%	
	<b>Açıklama:</b> İnşaat devam etmektedir.		
<b>ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ</b> 	<b>Proje Tutarı</b>	8.100.000	
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	2017	
	<b>Bitiş Tarihi</b>	2019	
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	0%	
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	0%	
	<b>Açıklama:</b> Avan proje Hazırlanarak Bakanlığımız DHDB onaylanmak üzere gönderilmektedir		

## EÜAŞ - AFŞİN ELBİSTAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Tutarı	11.300.000
Başlangıç Tarihi	1.01.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme	3%
Parasal Gerçekleşme	3%

Açıklama: Devam ediyor.


Proje Adı: Kuyu Kontrol ve Dalgıç Pompa Otomasyon Sisteminin Kurulması



Proje Tutarı	6.000.000
Başlangıç Tarihi	1.01.2014
Bitiş Tarihi	31.12.2018
Fiziki Gerçekleşme	16%
Parasal Gerçekleşme	16%

Açıklama: Devam ediyor.

Proje Adı: Afşin-Elbistan Linyit Havzası Teknik Etütleri



Proje Tutarı	32.500.000
Başlangıç Tarihi	1.01.2015
Bitiş Tarihi	31.12.2020
Fiziki Gerçekleşme	69%
Parasal Gerçekleşme	60%

Açıklama: Devam ediyor.



Proje Adı: Madencilik Yapı ve Tesisleri



Proje Tutarı	33.000.000
Başlangıç Tarihi	1.01.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme	1%
Parasal Gerçekleşme	1%

Açıklama: Devam ediyor.



Proje Adı: Makine ve Teçhizat



Proje Tutarı	17.175.000
Başlangıç Tarihi	1.01.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme	22%
Parasal Gerçekleşme	22%

Açıklama: Devam ediyor.

Proje Adı: Araç ve İş Makinaları



Proje Tutarı	8.383.000
Başlangıç Tarihi	1.01.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme	32%
Parasal Gerçekleşme	32%

Açıklama: Devam ediyor.

<b>Proje Adı: İdame ve Yenileme</b>	<b>Proje Tutarı</b>	2.367.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	1.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	5%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	5%
	<b>Açıklama: Devam ediyor.</b>	

<b>Proje Adı: Taşıt Listesi</b>	<b>Proje Tutarı</b>	458.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	1.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	83%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	83%
	<b>Açıklama: Devam ediyor.</b>	

<b>Proje Adı: Muhtelif Maden Sahaları Sondajlı Arama ve Etüt İşleri</b>	<b>Proje Tutarı</b>	3.000.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	1.01.2017
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.12.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	12%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	12%
	<b>Açıklama: Devam ediyor.</b>	

## KAHRAMANMARAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Proje Adı: Organize Sanayi Bölge Camii İkmal İnşaatı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	5.565.723
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	20.01.2016
RESİM	<b>Bitiş Tarihi</b>	30.08.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	95%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	90%
	<b>Açıklama:</b>	



## DHMI KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Proje Adı: Terminal Binası ve Müteammim Tesisler Yapımı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	59.374.875
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	1.12.2016
	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.10.2018
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	30%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	24%
	<b>Açıklama:</b> proje kapsamında yapılacak tesislerin inşaatları %30 oranında tamamlanmış durumdadır.	

<b>Proje Adı: PAT Sahaları Drenaj Kanallarının Rehabilitasyonu, Çevre Tel Örgülerin Yenilenmesi ve ARFF Yolları Yapımı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	8.321.265
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	19.08.2016
<b>RESİM</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>	31.10.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	80%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	57%
	<b>Açıklama:</b> Proje kapsamında olan işlerin sözleşmedeki teslim süresi 13.08.2017'dir. Projeye sonradan ilave edilen işler nedeniyle iş artışına gidilmiş olup, ilave süre verilmiştir. İşin %80'lik kısmı tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.	

<b>Proje Adı: Garaj Binası Yapımı</b>	<b>Proje Tutarı</b>	3.849.000
	<b>Başlangıç Tarihi</b>	27.10.2016
<b>RESİM</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>	30.11.2017
	<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	90%
	<b>Parasal Gerçekleşme</b>	70%
	<b>Açıklama:</b> Proje kapsamında garaj binası inşaatının %90'ı tamamlanmış durumdadır.	
